중점위험작업 | 비계 설치 계획서

평 면 도

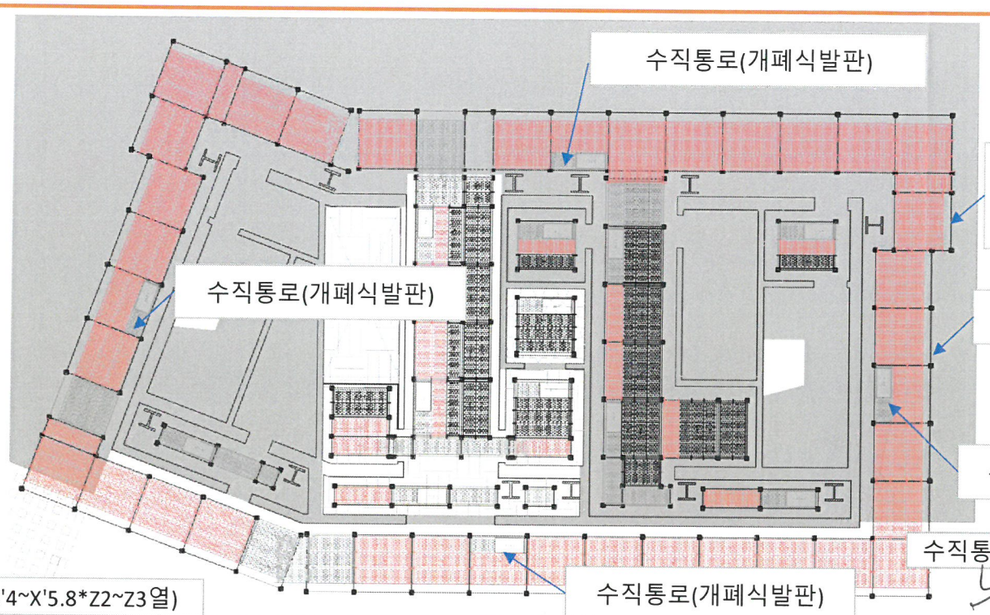

설치위치: B6F (X'4~X'5.8*Z2~Z3열)

단 면 도

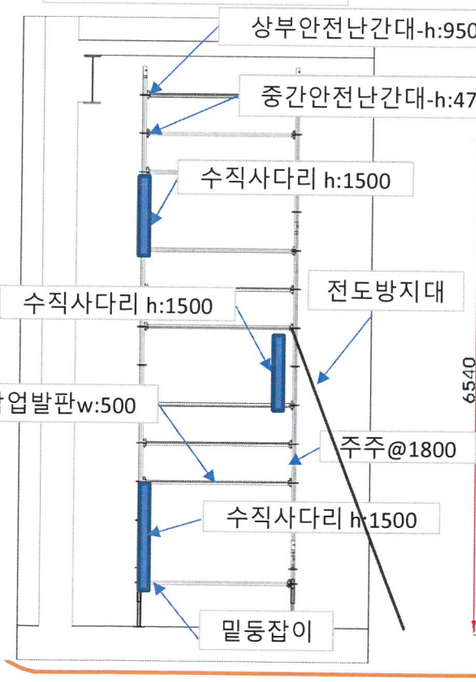

입 면 도

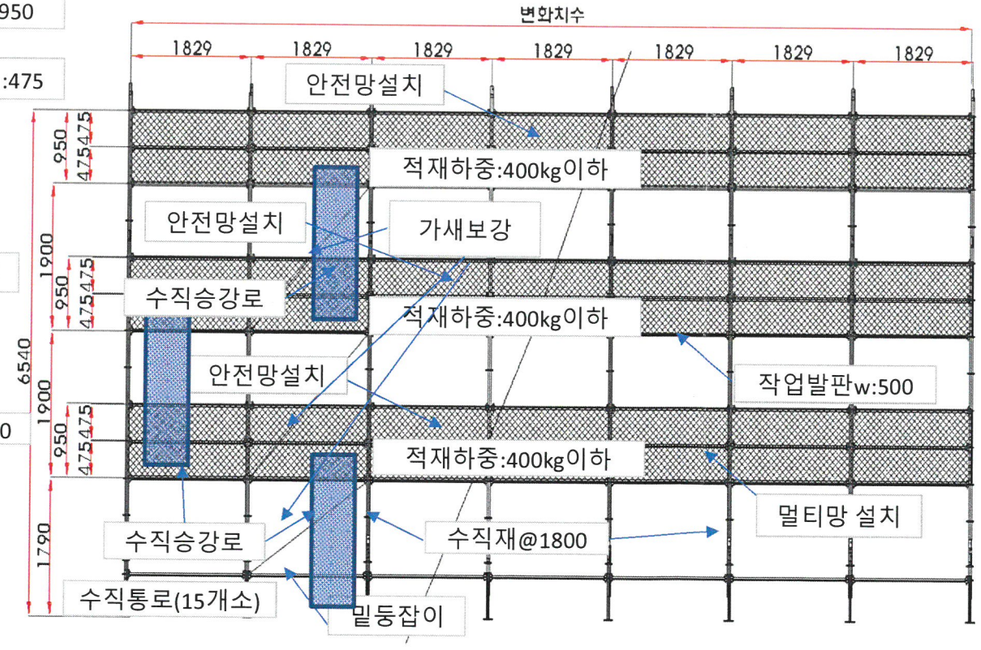

현 장 명	해성산업 복합시설 신축공사		
설치위치	B6F 코어 옹벽 시스템 쌍줄 비계 (X'4~X'5.8*Z2~Z3열)		
설치면적	1,306㎡ (길이:206M, 높이:6.54M)		
설치업체	태일씨앤티	사용업체	태일씨앤티
사용기간	2017 . 04. 21 . ~ 2017 . 07 . 20.		

<설치기준>			확인
안전난간	상부난간대 : 90cm~120cm → 95cm 중간난간대 : 상부난간~바닥의 중간 → 47.5cm 발끝막이판 : 10cm이상 → 안전망 (멀티망) 설치		ok
기둥간격	띠장방향 1.8m, 장선방향 1.5m이내		ok
띠장간격	1.5m이하, 첫단 2m이하		ok
가새	시스템용 가세 사용		ok
벽이음	전도방지대 설치		ok
적재하중	비계기둥간 400kg		ok
통로	경 사 로	-경사 30도이하 -높이 7m이내마다 계단참	
	수직승강로	-수직승강용사다리 사용 -해치발판 사용	ok
	계단통로	-강도 500kg/m2이상 -높이 3m이내마다 계단참	
작업발판	폭 50cm이상 추락위험장소 :난간/방망/안전대설비		ok
비계하부	미끄러짐과 침하방지 -깔판/깔목/받침철물/밑둥잡이		ok
낙하물방지망	10m이~~내외다~~, 첫단은 8m이내 → N/A		

< 현장 설치계획 >		
통로 (30m이내)	계단 : 외측( )개소, 내측(4)개소	
	수직사다리 : (4)개소 【※외측 설치금지】	
	경사로 : ( )개소	
벽이음	전용철물:□옹벽용□빔클램프□브라켓용 □매립용 → 전도방지대 설치	
비계하부 (m/m)	깔판(합판). : □ T=12↑, 규격(×)	
	깔목(토류판): □ 150*60↑*L( )	
낙하물방지망	형식 : ( ), 설치단수 : ( )단 N/A.	

< 확 인 >		
승인자	현장소장	민 영 학 (인)
검토자	공사팀장	(인)
	안전관리자	유 희 목 (인)
작성자	협력사소장	양 승 현 (인)
	공사담당	이 재 성 (인)

※작성방법

- 부대건물 등의 소규모 비계는 본양식 1장으로 작성
- 규모가 큰 건물은 평면/입면/단면/상세도를 포함함
- 표기사항 : 이동통로, 벽이음, 하부받침 등

중점위험작업 | 비계 설치 계획서

평 면 도

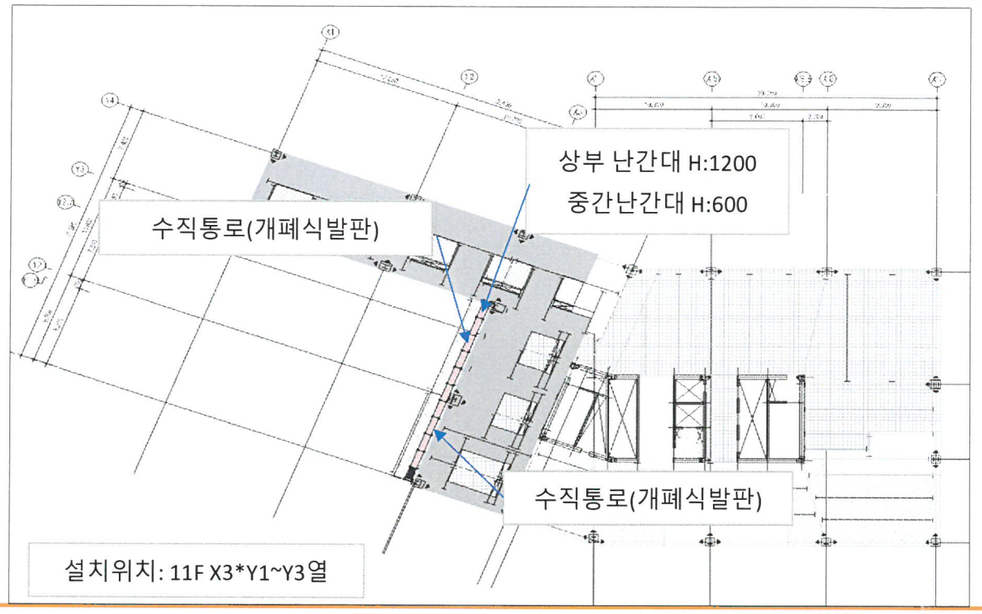

단 면 도

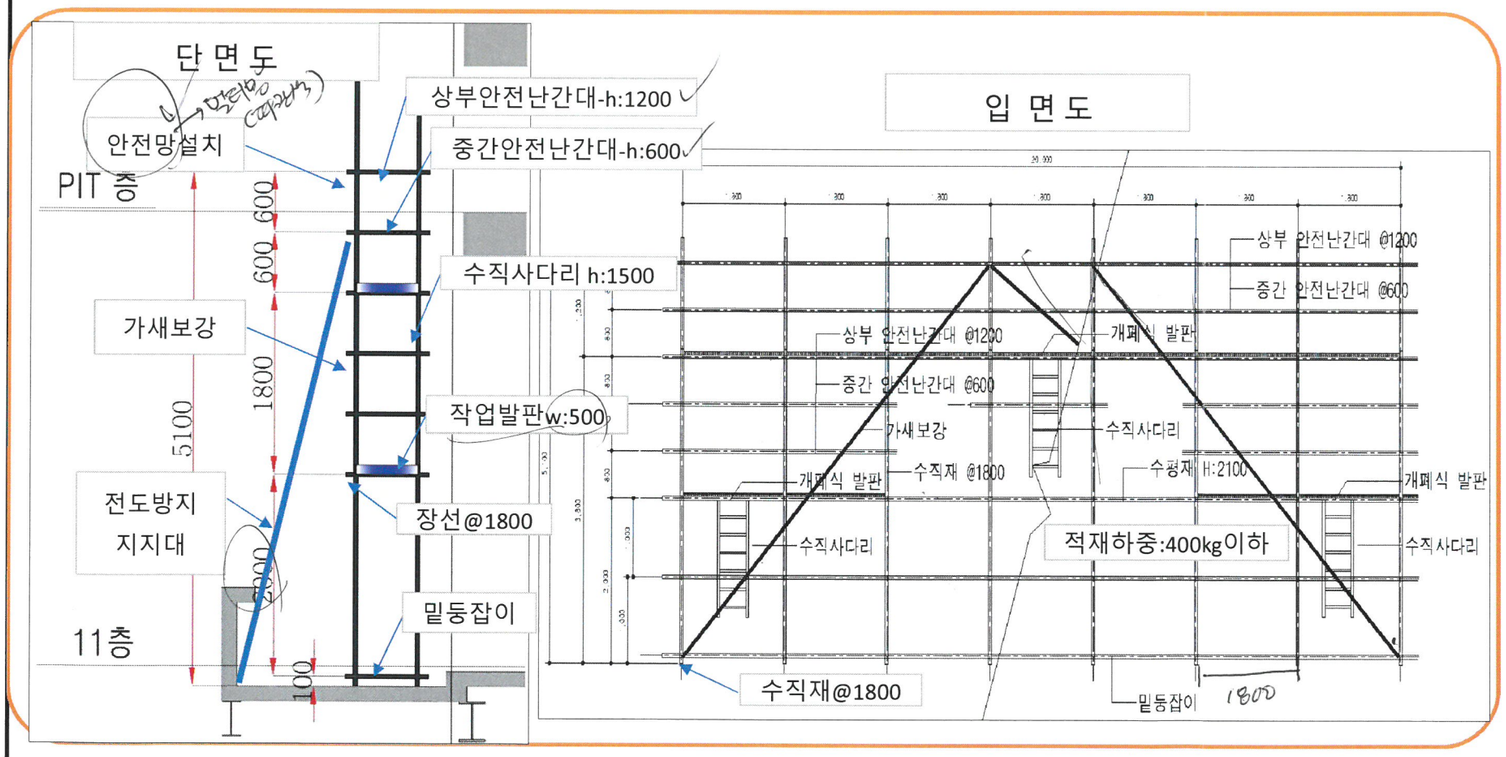

현 장 명	해성산업 복합시설 신축공사		
설치위치	11층 갱폼 미설치 구간 외부 쌍줄 비계 (X3*Y1~Y3열)		
설치면적	106㎡ (길이:20M, 높이:5.3M)		
설치업체	태일씨앤티	사용업체	태일씨앤티
사용기간	2017 . 02. 24 . ~ 2017 . 04 . 31.		

<설치기준>			확인
안전난간	상부난간대 : 90cm~120cm 상부: 1200		ok
	중간난간대 : 상부난간~바닥의 중간 중간: 600		ok
	발끝막이판 : 10cm이상 → 안전망 대체 (추락주의 표지판 설치)		ok
기둥간격	띠장방향 1.8m, 장선방향 1.5m이내		ok
띠장간격	1.5m이하, 첫단 2m이하 ok.		ok.
가새	기둥간격 10m마다 45도 각도		ok
벽이음	수직수평 5m*5m 간격, 벽이음 철물사용 전도방지대 설치		ok.
적재하중	비계기둥간 400kg		ok.
통로	경 사 로	-경사 30도이하 -높이 7m이내마다 계단참	N/A
	사 다 리	-사다리상단 60cm이상 -높이 5m이내마다 계단참 수직승강로 구조변경 설치	ok
	계단통로	-강도 500kg/㎡2이상 -높이 3m~~이내~~마다 계단참	N/A.
작업발판	폭 40cm이상 → 500 설치 추락위험장소 :난간/방망/안전대설비		ok.
비계하부	미끄러짐과 침하방지 -깔판/깔목/받침철물/밑둥잡이		ok
낙하물방지망	10m이내마다, 첫단은 8m이내		N/A.

< 현장 설치계획 >	
통로 (30m이내)	계단 : 외측( )개소, 내측( )개소 N/A.
	수직사다리 : (3)개소 【※외측 설치금지】
	경사로 : ( )개소
벽이음	전용철물:□옹벽용□빔클램프□브라켓용 □매립용 (N/A) → 전도방지대 대체
비계하부 (m/m)	깔판(합판). : □ T=12↑, 규격(×) (N/A)
	깔목(토류판): □ 150*60↑*L( )
낙하물방지망	형식 : ( ), 설치단수 : ( )단 (N/A)

< 확 인 >		
승인자	현장소장	민 영 학 (인)
검토자	공사팀장	방 명 근 (인)
	안전관리자	유 희 목 (인)
작성자	협력사소장	양 승 현 (인)
	공사담당	이 재 성 (인)

※작성방법

- 부대건물 등의 소규모 비계는 본양식 1장으로 작성
- 규모가 큰 건물은 평면/입면/단면/상세도를 포함함
- 표기사항 : 이동통로, 벽이음, 하부받침 등
