트럭 작업계획서

- 덤프트럭(차량계 건설기계), 화물자동차 등(차량계 하역운반기계) -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 :	담당자	검토	결재
○○건설(주)	담당자	관리감독자	사업주
수급인 :	검토자	수급인 사업주	(인)
(주)○○토건	작성자	수급인 담당자	(인)

1. 작업개요

작 업 명	00도로 건설공사 제1공구		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업장소	STA. 1+000 ~ 7+000, (6KM) / 연약지반 구간			
작업업체/인원	업체명	○○토건	인원	00명

2. 운전원 및 유도자, 작업지휘자 현황

운전원	성 명	김○○	면 허	건설기계조종사면허(굴착기)
	소 속	○○건기	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □건설기계조종사안전교육		
유도자	성 명	송○○	신호방법	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )		
작업지휘자	성 명	박○○	소 속	○○건설
	직 책		연락처	010-0000-0000

3. 기계 · 장비 제원 [건설기계/차량 등록증 □ 유 □ 무]

장비명(모델명)	00 트럭 (AB000-CDE0-EFGHI)		제조사(제조일)	00 기계(00.00.00)
등록번호	경기 06소 ○○○○		검사 유효기간	00.00.00. 까지
보험 여부	□ 가입(_____보험) □ 미가입		보험 유효기간	00.00.00. 까지
차량총중량	00 ton		제한속도	00 km/h
등판능력*	00 도(부하)		최고속도	00 km/h
적재함 용량	00 m^3	덤프	최대경사각	00 도
적재함 크기	길이 x 폭 x 높이 mm		상승시간	00 sec

* 등판능력 : 최대적재중량 상태의 트럭이 경사면을 올라갈 수 있는 능력(경사지면 최대경사각으로 표시)

[첨부 서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 기계 대여 사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

차량 종류	□덤프트럭 □화물자동차(*형식*) □특수운반차량(*트레일러, 윙바디 등*)	
작동상태	브레이크/클러치/유압장치/적재함	□정상 □비정상(조치 :)
방호장치	좌석안전띠	□정상 □비정상(조치 :)
	후사경 / 후방영상표시장치	□정상 □비정상(조치 :)
	전조등 / 후미등 / 후진경보장치	□정상 □비정상(조치 :)
	안전블록 / 안전지주 / 쐐기	□정상 □비정상(조치 :)
	급강하 방지장치 / 유압 밸브	□정상 □비정상(조치 :)
	적재함 고정철물 / 로프 / 사다리	□정상 □비정상(조치 :)

5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등 사전 조사내용

작업장소의 지형・지반 상태	작업장소 지형 및 **지반 상태**	□지반종류(*모래/일반 흙/연암/경암 등*) □경사(*1 : 1*) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 **함수 상태**	□양호 □불량(조치:)
	필요 **지내력** / 작업장소 **지내력**	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업・이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 **출입금지 조치**	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	도로, 경사면 단부 추락위험	□있음(조치 :) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 :) □없음

6. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
트럭 이동	부딪힘	후진하는 트럭에 작업자 부딪힘	▲작업 전 후방카메라, 후사경 확인 ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치
	부딪힘	경사면에 주차한 트럭이 갑자기 움직이면서 운전원 부딪힘	▲주정차 시 시동 및 브레이크 확인 ▲경사면 주정차 시 고임목 등 사용
	깔림	운행 중인 트럭이 갓길 경사면 아래로 굴러떨어져 운전원 깔림	▲도로 폭 유지, 다이크 설치 등 지반보강 ▲좌석안전띠 착용
적재함	맞음	적재함에서 떨어지는 토사, 자재 등에 하부 작업자 맞음	▲차량 제원을 준수하여 토사 적재 ▲운반 중 적재함 덮개 설치
	떨어짐	▲적재함 위에서 중량물을 로프 등 결속작업 중이던 작업자 떨어짐 ▲적재함 위에서 자재 정리작업 중이던 작업자 떨어짐	▲적재함 위에서 작업 금지(가급적 크레인, 리프트, 지게차 등을 사용) ▲불가피하게 적재함 위에서 작업할 경우, 안전대 체결 등 추락방지 조치
	떨어짐	이동하는 트럭 적재함에서 떨어짐	▲적재함에 작업자 태운 채로 이동 금지
	끼임	적재함이 급강하하여 하부 수리·점검 작업자 끼임	▲작업지휘자 지정 및 작업순서 결정 ▲적재함 하부 안전블록 등을 사용하여 갑작스러운 하강 방지

7-1. 덤프트럭 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

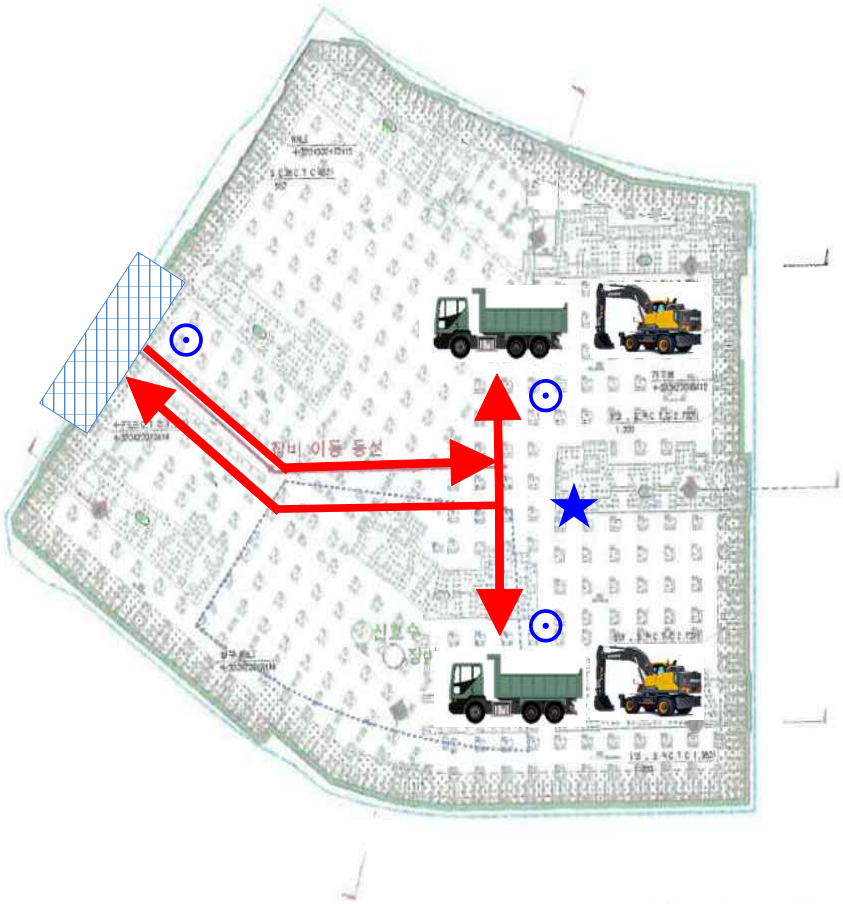

범 례	
표시	내 용
▣	장비
▦	현장 진출입로
⊙	유도자
★	작업지휘자
→	운행경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	현장 진입	근로자 및 차량간 진입로 미구획으로 충돌	근로자 및 차량간 진입로 구획
2	현장 내 운행경로 이동	굴착단부 및 경사지에서 도로 지반 붕괴로 차량 전복	운행경로 지반상태 조사 후 보강, 필요시 가드레일 설치
3	차량 점검	덤프트럭 하부 적재함 점검 시 적재함 하강에 의한 끼임	적재함 하부 점검 시 안전지주 또는 안전블록 설치 후 점검
4	작업장소 주정차	후진으로 이동 중 근로자 부딪힘	관계 근로자 외 출입금지 조치, 유도자 배치
5	상차작업	적재함 위에서 낙하물 덮개 씌우는 작업 중 바닥으로 떨어짐	차량 상부 등 고소작업 시 안전대, 안전모를 착용하고 작업실시
6	상차작업 직후 이동	적재함에서 떨어진 잔토에 주변 근로자 맞음	적재함 덮개를 닫고 견고히 고정한 후 이동, 작업지휘자 확인
7	정차·대기	운전석을 이탈한 상태에서 트럭이 미끄러져 차량 전복	운전자는 운전석 이탈 시 주차브레이크 체결 및 고임목 설치
8	현장 출차	세륜시설 이용 시 차량 부딪힘	유도자 배치 및 신호방법 준수

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

덤프트럭 작업안전 점검표〈앞면〉

점 검 자	*관리감독자, 작업지휘자 등*
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 건설기계 조종사면허, 1종 대형면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「자동차관리법」제43조 등 *「건설기계관리법」제13조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 운행경로 및 작업방법 등을 고려한 작업계획을 수립하고 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 상하차 장소, 운행경로의 지형 및 지반 상태를 확인하고 트럭이 넘어지지 않도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 가설도로는 무너지지 않도록 견고하게 설치하고, 차량이 굴러떨어지지 않도록 도로 폭을 확보한다.	☐	☑	*가설도로 측면 가드레일 설치*
	6. 제동장치・조종장치, 하역장치・유압장치의 기능 및 바퀴의 이상 유무를 점검한다.	☑	☐	
	7. 후진 경보장치, 후방카메라 등의 정상 작동 여부를 확인한다.	☐	☑	*후방카메라 교체*
운행 및 작업 중 조치	**8. 운행경로에 작업자의 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.**	☑	☐	
	9. 화물 적재함에는 작업자의 탑승을 금지하고, 부득이 탑승하는 경우 추락방지 조치를 한다.	☑	☐	
	10. 적재함 덮개를 고정하여 토사 등의 잔여물이 떨어지지 않도록 조치한다.	☐	☑	*적재함 덮개 불량으로 교체*
	11. 현장 내 제한속도를 표시하고 준수토록 한다.	☐	☑	*제한속도 표지 (20km/h) 부착*
	12. 운전자는 안전벨트를 착용한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	**13. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임목을 설치한다.**	☐	☑	*고임목 추가 구비, 현장 비치*
	14. 수리·점검 시 안전블록, 안전지주 등을 사용하여 적재함 등의 갑작스러운 하강을 방지한다.	☑	☐	

덤프트럭 작업안전 점검표<뒷면>

[수리·점검 및 적재함]

□ 유압실린더

□ 안전블록

□ 차체 연결볼트

□ 적재함 덮개

[충돌방지]

□ 운행경로 내 출입금지

□ 유도자 배치

[후방확인]

□ 후진 경보장치

□ 후방카메라

[주정차 시 조치]

□ 브레이크 체결

□ 시동키 분리

□ 고임대 설치

[운전자]

□ 안전벨트 착용

□ 제한속도 준수

[전도방지]

□ 지반 침하 방지

□ 도로 폭 유지

7－2. 화물자동차 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

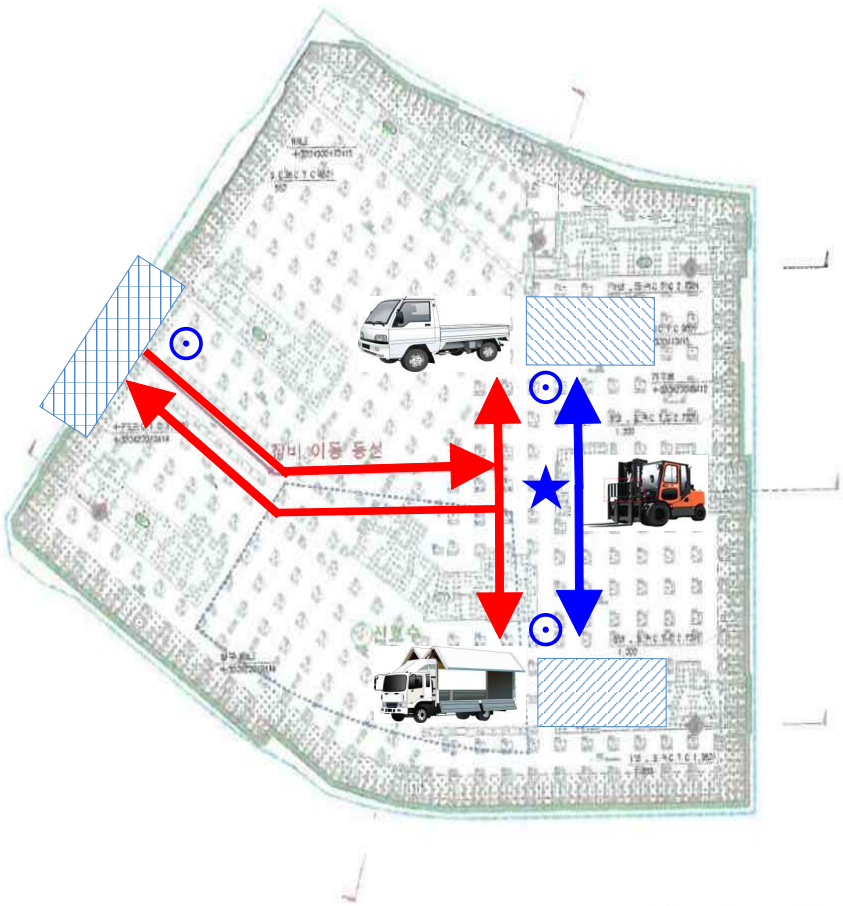

범 례	
표시	내 용
■	장비
▦	현장 진출입로
▨	철근 하역장
▨	창틀 하역장
⊙	유도자
★	작업지휘자
→	트럭 운행경로
→	지게차 경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	현장 입구 경사로 진입	과적으로 인해 경사로에서 차량이 뒤로 밀리며 측면 아래로 전복	과적 금지, 좌석 안전띠 착용
2	현장 진입	근로자 및 차량간 진입로 미구획으로 충돌	근로자 및 차량간 진입로 구획
3	현장 내 운행경로 이동	굴착단부 및 경사지에서 도로 지반 붕괴로 차량 전복	운행경로 지반상태 조사 후 보강, 필요시 가드레일 설치
4	작업장소 주정차	후진으로 이동 중 근로자 부딪힘	관계 근로자 외 출입금지 조치, 유도자 배치
5	자재 하역작업	적재된 화물이 쏟아져 맞음	화물은 단단히 고정하고, 높이 쌓아 올리거나 중간에서 빼내기 금지
6	자재 하역작업	적재함 위에서 작업 중 중심을 잃고 바닥으로 떨어짐	차량 상부 등 고소작업 시 안전대, 안전모를 착용하고 작업실시
7	현장 내 이동	과속 운전으로 횡단하는 근로자 부딪힘	현장 내 제한속도 표지 부착 및 준수
8	정차·대기	운전석을 이탈한 상태에서 트럭이 미끄러져 차량 전복	운전자는 운전석 이탈 시 주차브레이크 체결 및 고임목 설치
9	현장 출차	세륜시설 이용 시 차량 부딪힘	유도자 배치 및 신호방법 준수

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

화물자동차 작업안전 점검표〈앞면〉

점 검 자	*관리감독자, 작업지휘자 등*
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 화물운송자격증, (12톤 미만) 1종 보통면허 (12톤 이상) 1종 대형면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「자동차관리법」제43조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 운행경로 및 작업방법 등을 고려한 작업계획을 수립하고 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 상하차 장소, 운행경로의 지형 및 지반 상태를 확인하고 트럭이 넘어지지 않도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 가설도로는 무너지지 않도록 견고하게 설치하고, 차량이 굴러떨어지지 않도록 도로 폭을 확보한다.	☐	☑	*가설도로 측면 가드레일 설치*
	6. 제동장치・조종장치, 하역장치・유압장치의 기능 및 바퀴의 이상 유무를 점검한다.	☑	☐	
	7. 후진 경보장치, 후방카메라 등의 정상 작동 여부를 확인한다.	☐	☑	*후방카메라 교체*
운행 및 작업 중 조치	**8. 운행경로에 작업자의 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.**	☑	☐	
	9. 화물 적재함에는 작업자의 탑승을 금지하고, 부득이 탑승하는 경우 추락방지 조치를 한다.	☑	☐	
	10. 화물 적재 시 불안정하게 높이 쌓아 올리거나 적재중량을 고려하여 과적하지 않는다.	☑	☐	
	11. 화물 적재 시 적재된 화물이 흔들리지 않도록 로프, 철물 등으로 견고하게 고정한다.	☑	☐	
	12. 적재된 화물을 내리는 작업을 할 때는 화물 중간에서 빼내지 않도록 한다.	☑	☐	
	13. 현장 내 제한속도를 표시하고 준수토록 한다.	☐	☑	*제한속도 표지 (20km/h) 부착*
	14. 운전자는 안전벨트를 착용한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	**15. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임목을 설치한다.**	☐	☑	*고임목 추가 구비, 현장 비치*
	16. 수리·점검 시 안전블록, 안전지주 등을 사용하여 적재함 등의 갑작스러운 하강을 방지한다.	☑	☐	

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

화물자동차 작업안전 점검표<뒷면>

[상하역 작업]
- □ (원칙) 적재함 탑승 금지
- □ (예외) 탑승 시 안전모, 안전대 착용
- □ 화물 중간에서 빼내기 금지
- □ 작업장소 내 관계 근로자 외 출입 금지

[운전자]
- □ 안전벨트 착용
- □ 제한속도 준수

[화물 적재 시 조치]
- □ 과적 금지
- □ 불안정하게 높이 쌓기 금지
- □ 흔들리지 않도록 고정

[충돌방지]
- □ 운행경로 내 출입금지
- □ 유도자 배치

[전도방지]
- □ 지반 침하 방지
- □ 도로 폭 유지

[주정차 시 조치]
- □ 브레이크 체결
- □ 시동키 분리
- □ 고임대 설치

[후방확인]
- □ 후진 경보장치
- □ 후방카메라

붙임 **약식 트럭 작업계획서 예시** – 50억 미만 소규모 현장용 –

덤프트럭 작업계획서

– 차량계 건설기계 –

검토자	사 업 주 (인)
작성자	관리감독자 (인)

작업명(장소)	00도로 건설공사 제1공구		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)			
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 건설기계 조종사면허, 1종 대형면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「자동차관리법」 제43조 등 *「건설기계관리법」 제13조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 운행경로 및 작업방법 등을 고려한 작업계획을 수립하고 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 상하차 장소, 운행경로의 지형 및 지반 상태를 확인하고 트럭이 넘어지지 않도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 가설도로는 무너지지 않도록 견고하게 설치하고, 차량이 굴러떨어지지 않도록 도로 폭을 확보한다.	☐	☑	가설도로 측면 가드레일 설치
	6. 제동장치・조종장치, 하역장치・유압장치의 기능 및 바퀴의 이상 유무를 점검한다.			
	7. 후진 경보장치, 후방카메라 등의 정상 작동 여부를 확인한다.	☐	☑	후방카메라 교체
운행 및 작업 중 조치	**8. 운행경로에 작업자의 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.**	☑	☐	
	9. 화물 적재함에는 작업자의 탑승을 금지하고, 부득이 탑승하는 경우 추락방지 조치를 한다.	☑	☐	
	10. 적재함 덮개를 고정하여 토사 등의 잔여물이 떨어지지 않도록 조치한다.	☐	☑	적재함 덮개 불량으로 교체
	11. 현장 내 제한속도를 표시하고 준수토록 한다.	☐	☑	제한속도 표지 (20km/h) 부착
	12. 운전자는 안전벨트를 착용한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	**13. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임목을 설치한다.**	☐	☑	고임목 추가 구비, 현장 비치
	14. 수리·점검 시 안전블록, 안전지주 등을 사용하여 적재함 등의 갑작스러운 하강을 방지한다.	☑	☐	

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

□ 덤프트럭 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

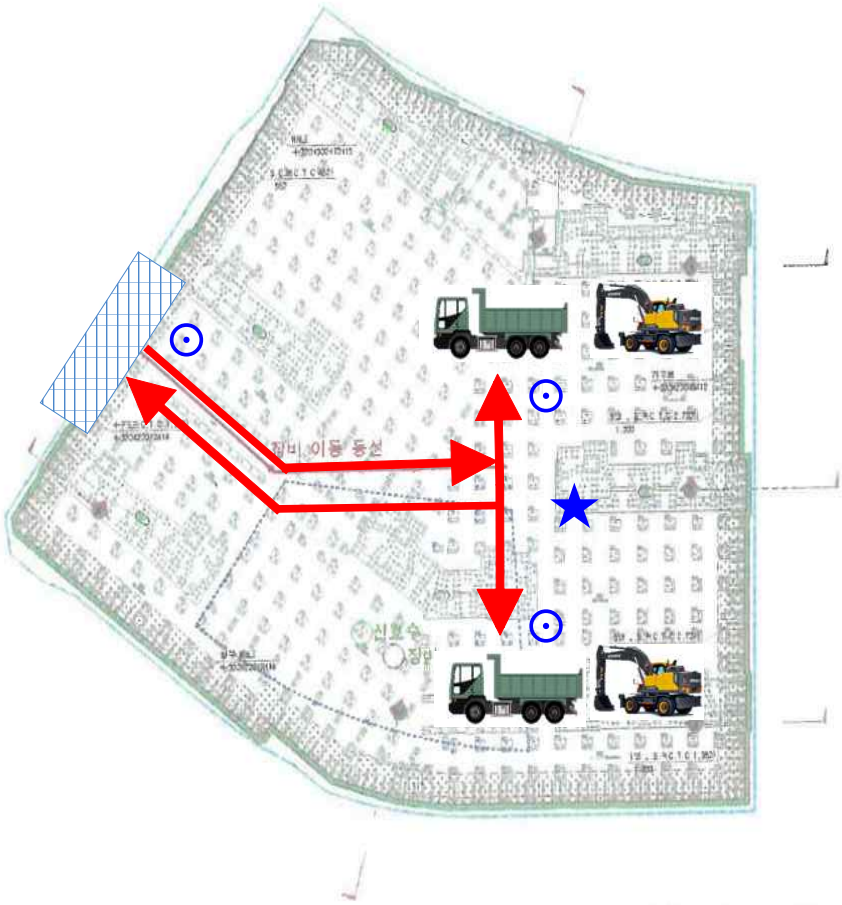

범 례	
표시	내 용
▣	장비
▦	현장 진출입로
⊙	유도자
★	작업지휘자
→	운행경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	현장 진입	근로자 및 차량간 진입로 미구획으로 충돌	근로자 및 차량간 진입로 구획
2	현장 내 운행경로 이동	굴착단부 및 경사지에서 도로 지반 붕괴로 차량 전복	운행경로 지반상태 조사 후 보강, 필요시 가드레일 설치
3	차량 점검	덤프트럭 하부 적재함 점검 시 적재함 하강에 의한 끼임	적재함 하부 점검 시 안전지주 또는 안전블록 설치 후 점검
4	작업장소 주정차	후진으로 이동 중 근로자 부딪힘	관계 근로자 외 출입금지 조치, 유도자 배치
5	상차작업	적재함 위에서 낙하물 덮개 씌우는 작업 중 바닥으로 떨어짐	차량 상부 등 고소작업 시 안전대, 안전모를 착용하고 작업실시
6	상차작업 직후 이동	적재함에서 떨어진 잔토에 주변 근로자 맞음	적재함 덮개를 닫고 견고히 고정한 후 이동, 작업지휘자 확인
7	정차·대기	운전석을 이탈한 상태에서 트럭이 미끄러져 차량 전복	운전자는 운전석 이탈 시 주차브레이크 체결 및 고임목 설치
8	현장 출차	세륜시설 이용 시 차량 부딪힘	유도자 배치 및 신호방법 준수

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

화물자동차 작업계획서

- 차량계 하역운반기계 -

검토자	사 업 주 (인)
작성자	관리감독자 (인)

작업명(장소)	00도로 건설공사 제1공구		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)			
기계·장비 제원	[별첨] 차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 화물운송자격증, (12톤 미만) 1종 보통면허 (12톤 이상) 1종 대형면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「자동차관리법」제43조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 운행경로 및 작업방법 등을 고려한 작업계획을 수립하고 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 상하차 장소, 운행경로의 지형 및 지반 상태를 확인하고 트럭이 넘어지지 않도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 가설도로는 무너지지 않도록 견고하게 설치하고, 차량이 굴러떨어지지 않도록 도로 폭을 확보한다.	☐	☑	가설도로 측면 가드레일 설치
	6. 제동장치・조종장치, 하역장치・유압장치의 기능 및 바퀴의 이상 유무를 점검한다.	☑	☐	
	7. 후진 경보장치, 후방카메라 등의 정상 작동 여부를 확인한다.	☐	☑	후방카메라 교체
운행 및 작업 중 조치	**8. 운행경로에 작업자의 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.**	☑	☐	
	9. 화물 적재함에는 작업자의 탑승을 금지하고, 부득이 탑승하는 경우 추락방지 조치를 한다.	☑	☐	
	10. 화물 적재 시 불안정하게 높이 쌓아 올리거나 적재중량을 고려하여 과적하지 않는다.	☑	☐	
	11. 화물 적재 시 적재된 화물이 흔들리지 않도록 로프, 철물 등으로 견고하게 고정한다.	☑	☐	
	12. 적재된 화물을 내리는 작업을 할 때는 화물 중간에서 빼내지 않도록 한다.	☑	☐	
	13. 현장 내 제한속도를 표시하고 준수토록 한다.	☐	☑	제한속도 표지 (20km/h) 부착
	14. 운전자는 안전벨트를 착용한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	**15. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임목을 설치한다.**	☐	☑	고임목 추가 구비, 현장 비치
	16. 수리·점검 시 안전블록, 안전지주 등을 사용하여 적재함 등의 갑작스러운 하강을 방지한다.	☑	☐	

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

□ 화물자동차 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

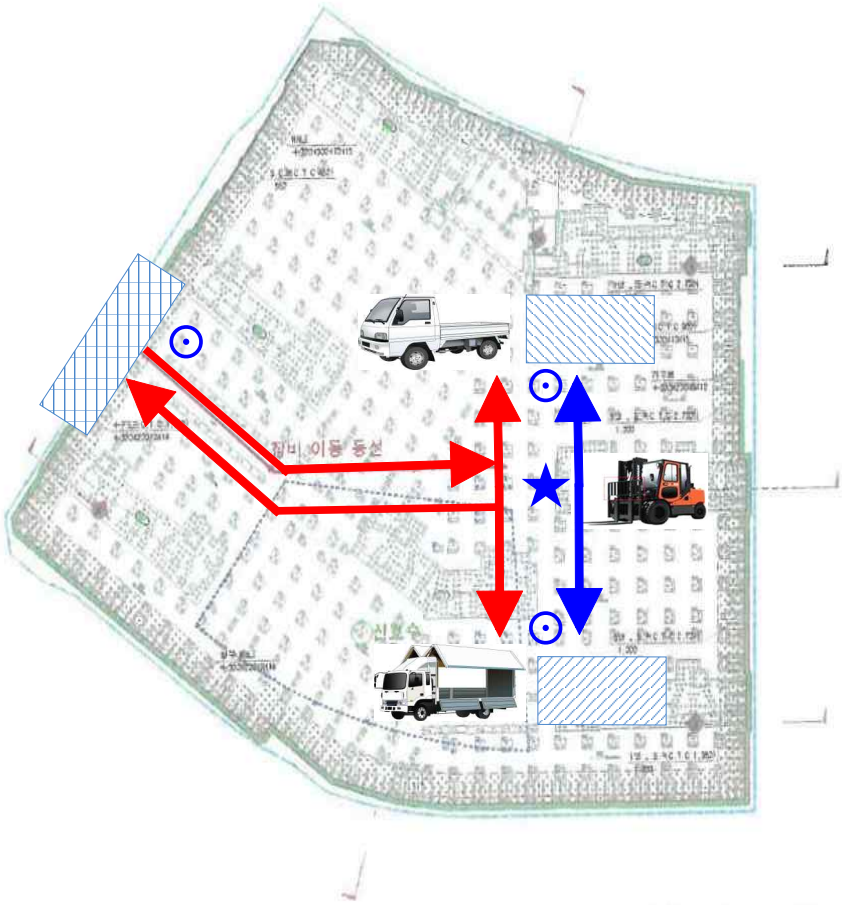

범 례	
표시	내 용
■	장비
▦	현장 진출입로
▨	철근 하역장
▨	창틀 하역장
⊙	유도자
★	작업지휘자
→	트럭 운행경로
→	지게차 경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	현장 입구 경사로 진입	과적으로 인해 경사로에서 차량이 뒤로 밀리며 측면 아래로 전복	과적 금지, 좌석 안전띠 착용
2	현장 진입	근로자 및 차량간 진입로 미구획으로 충돌	근로자 및 차량간 진입로 구획
3	현장 내 운행경로 이동	굴착단부 및 경사지에서 도로 지반 붕괴로 차량 전복	운행경로 지반상태 조사 후 보강, 필요시 가드레일 설치
4	작업장소 주정차	후진으로 이동 중 근로자 부딪힘	관계 근로자 외 출입금지 조치, 유도자 배치
5	자재 하역작업	적재된 화물이 쏟아져 맞음	화물은 단단히 고정하고, 높이 쌓아 올리거나 중간에서 빼내기 금지
6	자재 하역작업	적재함 위에서 작업 중 중심을 잃고 바닥으로 떨어짐	차량 상부 등 고소작업 시 안전대, 안전모를 착용하고 작업실시
7	현장 내 이동	과속 운전으로 횡단하는 근로자 부딪힘	현장 내 제한속도 표지 부착 및 준수
8	정차·대기	운전석을 이탈한 상태에서 트럭이 미끄러져 차량 전복	운전자는 운전석 이탈 시 주차브레이크 체결 및 고임목 설치
9	현장 출차	세륜시설 이용 시 차량 부딪힘	유도자 배치 및 신호방법 준수
